


Info Logistikkonzept

Der Totalunternehmer, Firma Blumer + Lehmann AG aus Gossau, hat die Anlieferung der Module für den Holzmodulbau Schlossmatt an die Forrer AG Safety & Security Services aus Bassersdorf beauftragt.

Die Anlieferung erfolgt in zwei Etappen, gestaffelt nach Gebäudeteilen. In der ersten Etappe vom 27. Mai bis 4. Juni 2024 werden die Module für den Gebäudeteil Nr. 9a angeliefert und montiert. In der zweiten Etappe vom 17. bis 26. Juni 2024 erfolgt die Lieferung und Montage der Module für den Gebäudeteil Nr. 9.

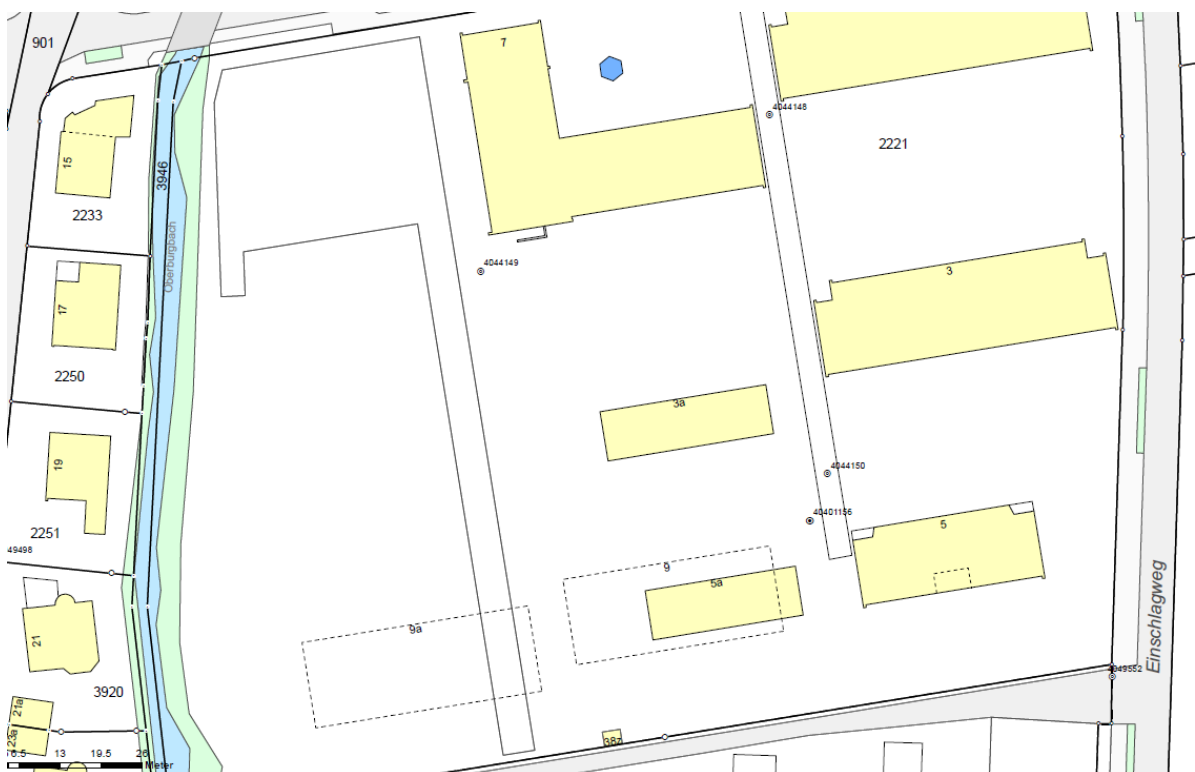


Situationsplan Schulanlage Schlossmatt

Die Anlieferung erfolgt jeweils im Zeitraum von 7:00 bis 18:00, wobei der Schulbetrieb berücksichtigt wird (auch Solennität/Montag, 24. Juni 2024) und verkehrsreiche Zeiten wie Schulstart und Mittagspause vermieden werden.

Damit die Gefahrensituation für die Kinder minimiert werden kann aber auch der Verkehrsfluss im Quartier weiter gewährleistet werden kann, werden 3 Posten (einweisende Personen) eingerichtet, die den Verkehr beobachten, die anliefernden Sattelzüge begleiten und das Manövrieren sichern. Der erste Posten ist an der Grunerstrasse/Hasleweg, der zweite an der Kreuzung Grunerstrasse/Einschlagweg und der dritte an der Einfahrt auf das Schulareal aufgestellt.

Posten 1 & 2

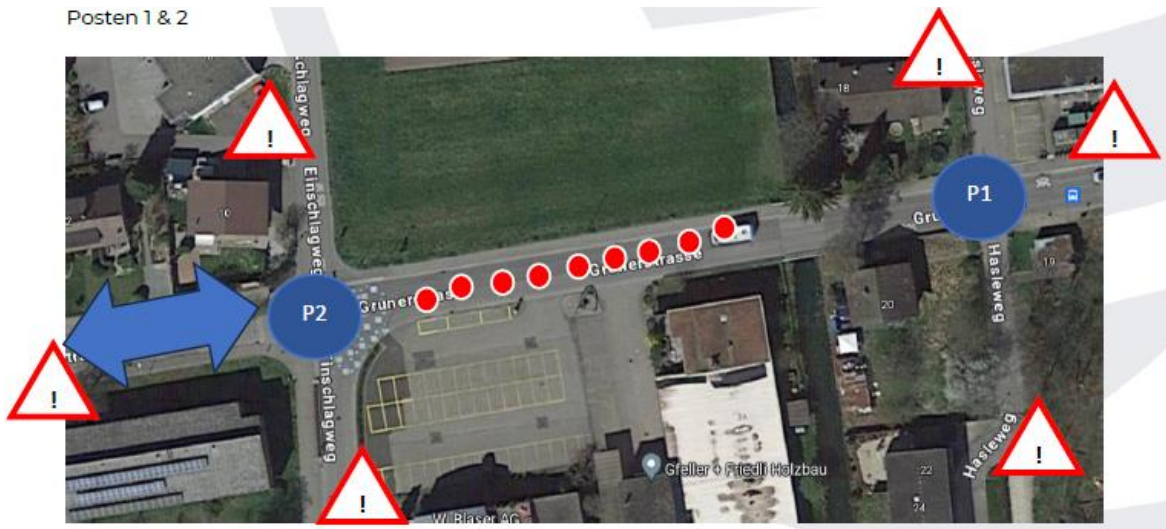

Grafik: Forrer Safety & Security Services

Posten 3



Grafik: Forrer Safety & Security Services
